



Changement Climatique et Forêts dans le Bassin du Congo Synergies entre l'Adaptation et l'Atténuation (COBAM)

Rapport intérimaire du 25 septembre 2014



Résumé

L'objectif général de ce rapport est de faire le point sur l'état d'avancement de la convention entre la CEEAC et le CIFOR dans le cadre de la mise en œuvre du projet COBAM.

Plus spécifiquement, il s'agissait de :

- Présenter l'état d'avancement du volet recherche et communication de la convention,
- Présenter l'état d'avancement de la mise en œuvre des projets pilotes
- Présenter les activités en cours et celles qui ne pourraient pas être faites avant la fin du mois de décembre 2014.

Les principales difficultés rencontrées:

- le non versement par la CEEAC des fonds de contrepartie stipulés dans la convention et correspondant à 25% environ du budget initial du projet ;
- L'inconsistance dans le versement des fonds ;
- Le premier virement perçu par les projets pilotes à 09 mois de la fin du projet.

Ces difficultés ont occasionné des délais pour bon nombre d'activités et du retard dans la livraison des produits attendus.

Au Regard de ces difficultés et du retard accusé dans le démarrage des activités dans les sites pilotes, nous proposons:

- D'accorder au projet COBAM une extension d'au moins un an pour permettre aux projets pilotes de soutenir les projets pilotes, de finaliser les activités en cours et de réaliser d'initier quelques autres ;
- De mettre à la disposition du projet des fonds de contrepartie CEEAC stipulés dans la convention.
- De mettre à la disposition des gestionnaires des projets pilotes les moyens financiers leur permettant de mettre en œuvre les projets de manière sereine.

Contenu

Contexte	3
Etat d'avancement du COBAM.....	3
La coordination.....	3
La recherche et la communication	3
Les six composantes de la recherche et communication:.....	3
La Communication.....	5
Etat d'avancement des projets pilote	8
Etat d'avancement du PTBA 2014.....	8
Situation financière	8
Ressources FAD	8
Fonds de contrepartie de la CEEAC	9
Situation financière au 25 septembre 2014	9
Propositions.....	9
Problématique.....	9
Sollicitation.....	10
Annexe 1. Etat d'avancement du PTBA 2014.....	11
Annexe 2. Plan de travail budget Annuel (PTBA) 2015	15

Contexte

En 2010, à Libreville au Gabon, la Communauté Economique des Etats d'Afrique centrale (CEEAC) et le Centre pour la recherche forestière internationale (CIFOR) signent une convention de partenariat pour la mise en œuvre du projet 'Changement Climatique et Forêts dans le Bassin du Congo : Synergies entre l'Adaptation et l'Atténuation (COBAM)'. COBAM est un projet initié par le CIFOR et financé par la Banque africaine de développement (BAD) dans le cadre de son soutien à la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC), pour la mise en œuvre du Programme d'Appui à la Conservation des Ecosystèmes du Bassin du Congo (PACEBCo). La durée du projet est de 9 semestres, allant du 22 mai 2010 au 21 décembre 2014.

Ce rapport intérimaire présente le bilan sommaire du projet après quatre années d'activités, avec pour finalité de constater les progrès accomplis et les écarts, mais aussi de solliciter une extension pour finaliser les initiatives en cours.

Etat d'avancement du COBAM

Le projet COBAM comporte trois volets que sont la coordination, la recherche et la mise en œuvre des projets pilotes d'adaptation et d'atténuation en synergie.

La coordination

Il s'agit de coordonner le travail de l'équipe, surveiller la mise en œuvre du projet, la gestion financière, assurer la cohésion interne et une communication fluide avec le bailleur de fonds et entre les partenaires. Il s'agit aussi de suivre les contrats, établir les plans de travail, organiser les réunions et gérer les processus de rapports annuels et d'évaluation.

Les produits attendus de la coordination sont les rapports trimestriels, les plans de travail et de budget annuels (PTBA), les rapports annuels, les rapports de comité de suivi et des documents spécifiques commandés par les bailleurs.

Au 25 septembre 2014, le COBAM a mis à la disposition du PACEBCo :

- 15 rapports trimestriels,
- 4 PTBA,
- 3 rapports de Comité de Suivi,
- 2 rapports annuels,
- 1 rapport semestriel,
- 1 rapport à mi-parcours,

Soit 26 documents relatifs à la coordination du projet.

La recherche et la communication

La recherche est organisée en composantes. Celles directement liées à la mise en œuvre des projets pilotes (C3, C4 et C5) ont connues un grand retard tandis que les autres (C1, C2 et C6) sont dans leur phase finale.

Les six composantes de la recherche et communication:

1. Analyse des politiques environnementales, forestières et climatiques aux niveaux national et régional

2. Evaluation de la vulnérabilité des populations locales et les besoins d'adaptation
3. Etudes des causes et agents de la déforestation et les liens avec la REDD+
4. Analyse des opportunités et des contraintes de la mise en synergie de l'adaptation et l'atténuation sur le terrain
5. Accompagnement des décideurs nationaux et régionaux
6. Renforcement de capacités et communication



Le bilan sera présenté par composante.

Le tableau 1 présente le nombre des documents déjà publiés, ceux en cours et ceux planifiés en mai 2014 tandis que la figure 1 donne des indications sur les types des documents publiés.

Tableau 1. Statut des publications en mai 2014

Component	Planifié	En cours	Finalisé/publié	Total général	Qté dans la proposition
Component 0	2	1	26	29	30
Component 1	3	4	13	20	16
Component 2	5	6	15	26	14
Component 3	4	1	0	5	9
Component 4	6	6	5	17	3
component 5	2	0	1	3	4
component 6	6	3	90	99	18
Total général	27	21	150	199	94

NB. La composante 0 fait référence à la coordination du projet et les documents y référents sont les rapports déjà mentionnés plus haut.

Il ressort du tableau que si un grand nombre de documents sont déjà publiés ou finalisés, il en reste 23 en cours et 27 qui attendent les données collectées dans les sites pilotes pour être réalisés. On peut aussi noter qu'il y a relativement peu de publications pour les composantes 3, 4 et 5. Cela est dû

au fait que ces produits sont assujettis à la mise en œuvre des projets pilotes qui, eux, n'ont démarré qu'en mars 2014.

La Communication

Le tableau 1 montre qu'un accent particulier a été mis sur le dialogue science politique et la communication, avec 90 produits livrés sur 146. Une de nos recherches préliminaires a montré la faiblesse de la communication dans le bassin du Congo. C'est donc à dessein que le projet COBAM a privilégié le partage des connaissances.

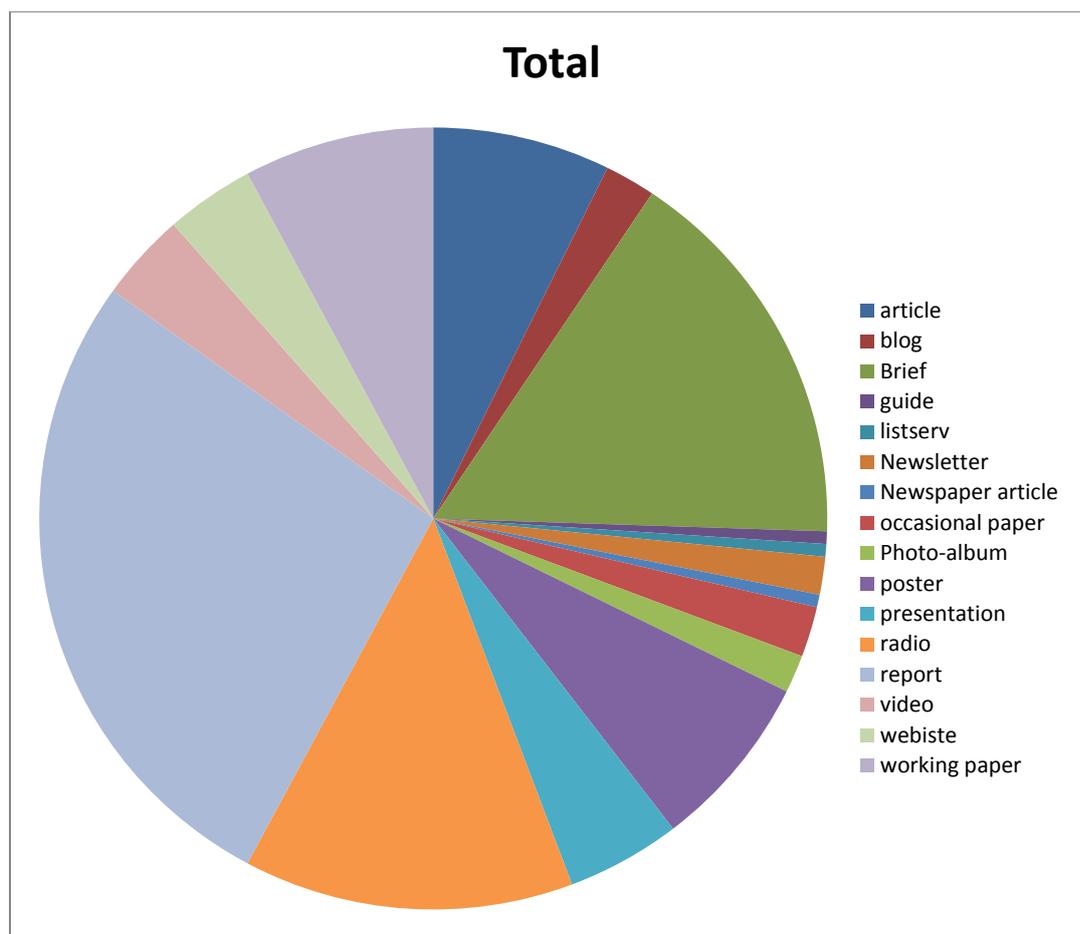


Fig. 1. Types de documents publiés.

Si une quinzaine d'articles ont déjà été publiés dans les journaux scientifiques, la figure 1 montre que bon nombre de documents publiés sont des supports de dissémination ciblant le grand public : les briefs, les articles dans les journaux, la radio, etc.

De nombreux canaux ont été utilisés pour diffuser les informations et les connaissances, non seulement celles générées par COBAM et le CIFOR, mais aussi et surtout celles disponibles dans la région. Citons ici quelques-uns :

Présentations aux fora et ateliers internationaux, régionaux et nationaux

Les émissions radiophoniques

Nous avons mis sur pied un programme radio, d'abord en Français, puis en langues locales. Les dix émissions radio en Français ont été diffusées sur les ondes du poste national de la CRTV, avec reprise des émissions par la Radio Environnement et ses partenaires de RERAC ; sur Youtube à travers le site Web COBAM : www.cifor.org/cobam;

Le succès de ces premières émissions nous a permis de lever les fonds auprès de AuAID à concurrence de 20.000\$ pour étendre l'audience par l'enregistrement de 6 émissions en lingala, 4 en Kituba, couramment parlé en RDC et Congo, et 4 autres en Pidjin English parlé à dans une bonne partie du Cameroun et au Nigeria. Ces programmes radios ont été distribués et diffusés au Cameroun, au Gabon, à la République du Congo et en RDC, Grace au partenariat de diffusion avec des radios nationales et des radios privées.

La Newsletter du COBAM

COBAM News retrace la vie du projet et promène le lecteur dans les sites du projet, l'aide à mieux comprendre les publications du projet et les communications faites sur le projet. A ce jour, trois bulletins ont été publiés.



Enregistrement du programme radio au Cameroun



Enregistrement du programme radio au Congo



Les flyers

Les flyers sont des documents simplifiés, qui vise la communication sur les concepts scientifiques ou sur les activités du projet. A ce jour, 22 flyers ont été publiés, y compris ceux relatifs à la présentation des paysages du PACEBCo, des sites, à la vulnérabilité des communautés locales et aux projets pilotes.

Site WEB COBAM

Le site Web du COBAM a été conçu en 2011, en Français et en Anglais. Il est régulièrement mis à jour. Vous êtes invités à le visiter au :

cifor.org/cobam



Autres

De nombreux autres canaux ont été utilisés, parmi lesquels les gadgets, les blogs, les listes de contact, les posters, les albums photos,

les documentaires video.

Le projet COBAM a également mis l'accent sur **la formation et le renforcement des capacités**. On peut citer :


- L'encadrement d'une dizaine d'étudiants en Master II,
- La formation des journalistes et communicateurs d'Afrique centrale en communication sur le changement climatique
- La formation intensive des gestionnaires des projets pilotes

Depuis 2011, le COBAM a initié cinq projets pilotes dans cinq paysages du PACEBCo. Ils sont mis en œuvre par nos partenaires nationaux que sont ARECO au Rwanda, INDEFOR en Guinée équatoriale, RAFM et UEFA en RDC et ROSE au Cameroun. Après une longue gestation due aux problèmes de décaissement, quatre d'entre eux ont pu effectivement démarrer à partir de mars 2014. Nous avons profité de la longue latence pour former les gestionnaires des projets en montage de projets REDD+ adaptation; à la recherche action participative (RAP), en MRV et en suivi-évaluation des projets. Cette période a également été mise en contribution pour finaliser les documents des projets.

L'ambition que le CIFOR affiche pour ces projets pilotes est de les accompagner non seulement dans la mise en œuvre des projets, mais aussi de les rendre 'vendables'. Pour cela, nous avons renforcé les capacités des gestionnaires des projets dans la compréhension des concepts et dans la mise en œuvre des activités d'adaptation et de la REDD+ ; nous sommes en train de mener les études pour la caractérisation de ces sites avant la mise en œuvre des projets. Cette caractérisation couvre les aspects biophysiques notamment la mesure des stocks de carbone existants, la gouvernance, le capital socio-économique. Nous voulons établir les données de référence, base d'un processus de suivi-évaluation et d'évaluation des impacts dans le futur. Nous sommes en train de finaliser les PIN (Project Idea notes) des projets pilotes. Nous nous proposons de rédiger les PDD (Project Design documents) de ces projets sous le modèle de Plan Vivo qui sied à ce genre d'entreprises communautaires, si nous disposons de temps nécessaires.

Nous avons déjà mis sur pied un processus de suivi-évaluation des projets pilotes, composé de deux parties : le suivi-évaluation des performances, qui concerne les activités réalisées en rapport avec celles planifiées. A cela se superpose le suivi-évaluation participatif des incidences. Ici, ce sont les changements d'attitudes ou de comportement des acteurs ciblés qui sont enregistrés au fur et à mesure.

Comme résultats, il a été publié sur les projets pilotes à ce jour 5 infobriefs, soit un par projet. Ils donnent les informations sur la vulnérabilité aux perturbations climatiques dans le site du projet et comment le projet entend renforcer les capacités d'adaptation des populations et la résilience des écosystèmes. Par ailleurs, 5 PIN sont en cours de finalisation et les études à la base de la rédaction des PDD ont déjà été menées dans trois sites.

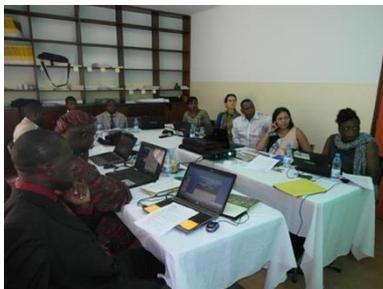

Formation des porteurs de projets



Initiation des étudiants à l'utilisation des GPS sur le terrain



Formation des journalistes de l'Afrique centrale

Etat d'avancement des projets pilote

En Septembre 2014, tous les gestionnaires des projets pilotes ont perçu le premier décaissement. Si ROSE, UEFA, RAFM et ARECO ont reçu des fonds entre mars et mai, INDEFOR vient de recevoir le sien. Par conséquent, quatre sur cinq projets pilotes ont démarré les activités.

Les projets d'ARECO, de RAFM et d'UEFA ont déjà pris de l'envol. Ils ont amorcé leur deuxième semestre de fonctionnement et vont de ce fait demander le deuxième virement. Dans l'ensemble, les projets pilotes sont dans une bonne dynamique et il serait dommage que les problèmes de financement ralentissent leur élan.



Sensibilisations des populations respectivement au Rwanda, au Cameroun et en RDC, via les causeries éducatives, les animations et la projection des films et documentaires

Etat d'avancement du PTBA 2014

L'annexe 1 présente cet état, en ce qui concerne les activités et les produits livrables. Il en ressort que :

De nombreux documents ont été finalisés en 2014 ou sont en cours de finalisation. Cependant, peu sont publiés à cause de la longueur et de la rigueur de la procédure de publication.

Certaines activités ont été menées dans certains sites, mais pas dans d'autres. Elles sont donc à être programmées dans des sites où elles n'ont pas encore eu lieu. C'est ainsi le cas pour les études pour établir les scénarios de référence qui ont été menées au Cameroun, dans un site en RDC et au Rwanda, mais que nous comptons continuer en Guinée équatoriale en 2015, si une extension nous est accordée.

Il existe des activités planifiées, mais qui n'ont pas encore démarré à cause des perturbations de financement que le projet a connu depuis le début. Elles seront reportées en 2015 (voir annexe 2)



Préparation des pépinières dans les zones du projet pilote COBAM au Rwanda

Situation financière

Ressources FAD

Depuis la signature de la convention en mai 2010, le début officiel du projet en octobre 2010 jusqu'en juin 2014, le CIFOR a reçu un montant total de USD 1.898.106,16 (un million huit cent quatre-vingt-dix-huit mille cent six virgule seize dollars US) des fonds FAD pour la mise

en œuvre des activités du projet COBAM. Un montant de 350,000\$ a encore été transféré le 29 septembre 2014, ce qui relève le décaissement à 2.158.106,16\$.

Fonds de contrepartie de la CEEAC

A cette date, les fonds de contrepartie ne sont pas encore versés et ils sont toujours attendus.

Situation financière au 25 septembre 2014

N°	USD	FAD		CEEAC		OBSER- VATIONS
	COMPOSANTE 1	MONTANTS	%	MONTANTS	%	
1	Fonds de roulement reçus (en comparaison au Fonds de roulement de la convention)	2.158.106,16	49,84%	/	/	
3	Paiements du 1 ^{er} octobre 2010 au 25 septembre 2014 (en comparaison au Fonds de roulement reçu)	2.962.156	137,25%	/	/	
	Solde FR (Sommes des entrées - dépenses) (1-3)	-804.049,84	-37,25%	/	/	

Tel que nous le constatons dans le tableau ci-dessus, au 25 septembre le solde du FR disponible est largement négatif. Il convient de rappeler qu'une bonne partie des avances faites par le CIFOR pour le compte du projet n'ont pas encore été remboursées.

Le dossier de justification d'une partie des dépenses effectuées au courant de l'année dernière a été déposé à l'UGP et nous sommes en cours de justification d'une autre partie de ces dépenses.

Propositions

Problématique

- La précarité financière dans laquelle le projet a été mis en œuvre a été plusieurs fois soulignée par le Comité de suivi ;
- Le COBAM n'a pas encore reçu de la CEEAC les fonds de contrepartie stipulés dans la convention et correspondant à 25% de son budget initial.
- Malgré le support du CIFOR qui a préfinancé les activités et même financé dans certains cas, les incertitudes qui ont entouré l'environnement de la mise en œuvre du projet l'a rendu très complexe ;
- Malgré cela, nous avons eu des résultats probants dont nous sommes très fiers, à l'instar des publications dans des journaux très sélectifs, mais surtout les émissions radiophoniques qui

ont permis que les concepts et les connaissances sur le changement climatique atteignent des millions de personnes dans le Bassin du Congo.

- Par ailleurs, les projets pilotes approuvés pour un financement sur deux ans ont commencé à recevoir des fonds 09 mois de la fin du projet. Ils ont encore besoin d'accompagnement. Par ailleurs, plusieurs volets de la recherche, notamment les composantes 3, 4 et 5, sont assujetties à la mise en œuvre de ces projets.
- Si la fin du projet est maintenu pour décembre 2014, l'équipe du COBAM qui vient de collecter des données n'aura pas le temps de les dépouiller, les nettoyer, les digitaliser, les analyser et produire des documents de valeur susceptibles de rendre les projets 'vendables'.

Sollicitation

Nous sollicitons :

- une extension d'au moins un an pour assurer le suivi des projets pilotes et produire les documents qui les accompagnent à partir des études que nous avons faites ;
- Que la CEEAC nous verse les fonds de contrepartie (environ 25% du budget initial) qui est à mesure de couvrir les dépenses du projet en 2015.
- Que le Comité de Pilotage examine et mette en place des mécanismes pour assurer la continuité des décaissements en faveur des projets pilotes (après transfert de 50% des pièces justificatives du précédent décaissement).

Annexe 1. Etat d'avancement du PTBA 2014

Actions	Planifié (non réalisé)	En cours	Finalisé	Publié
0.1.1. Rapports d'avancement du projet : rapports trimestriels, rapport annuel, rapport de comité de suivi.	X	X	X	
0.2.1. Rapport sur la planification et les méthodes : PTBA			X	
1.1.1. Documents décrivant le dialogue science-politique, le besoin d'information des preneurs de décision et l'information disponible que les scientifiques et les praticiens de la région peuvent fournir.				
Publication document des politiques en RDC		X		
Finalisation et publication du rapport "Gap Analysis: Information and Knowledge of REDD+ and adaptation to climate change in the Congo Basin" (<i>produit cobam 1.1.1 B</i>)		X		
Elaboration et publications des policy briefs basés sur les résultats de l'étude du gap analysis indiquant les besoins de recherche et de renforcement des capacités (<i>produit cobam 1.2.3</i>)	X			
Finalisation de l'article sur les perceptions de vulnérabilité par différents acteurs (<i>produit cobam 1.3.1.</i>)	X			
Finalisation de la meta analyse sur la cartographie de la vulnérabilité (<i>produit cobam 1.3.2.</i>)				X
Publier le document sur les facteurs de déforestation (<i>cobam 1.4.1</i>)		X		
Finaliser et publier le document sur les projets et initiatives (<i>cobam 1.4.2.</i>)			X	
Analyser les <u>opportunités REDD</u> à l'échelle regionale et nationale (<i>cobam 1.4.3</i>)	X			
2.1.2. Article synthétisant les résultats des études de terrain sur le rôle des forêts dans la réduction de la vulnérabilité des communautés locales.				
Publication d'un document synthétisant les résultats de terrain sur le rôle des forêts dans la réduction de la vulnérabilité des communautés locales (<i>produit cobam 2.1.2.</i>)	X			
2.1.3. Article de synthèse sur la vulnérabilité des groupes marginalisés.				
Publication d'un document (joint paper) de synthèse sur la vulnérabilité des groupes marginalisés basé sur les phases 1 & 2 de COBAM (<i>produit cobam</i>		X		

2.1.3)				
Publication d'un article de journal sur la vulnérabilité des femmes rurales en Guinée Equatoriale (Alba, 2014) (<i>produit cobam 2.1.3 additionnel</i>)			X	
2.1.4. Article de synthèse sur les savoirs locaux et les stratégies adaptatives des communautés locales (incluant les règles de décision et les heuristiques), les faiblesses des stratégies locales et les possibilités de surmonter ces faiblesses.				
Publication d'un "Synthesis paper on local knowledge and adaptive strategies of local communities (including decision making rules and heuristics), gaps in local coping strategies and opportunities for overcoming these gaps. (based on SEI fieldtrip 2013)" (<i>produit cobam 2.1.4.</i>)		X		
2.2.1. Un protocole de recherche action sur comment engager les acteurs locaux dans la conception et le test de l'adaptation.				
Publication d'un document sur "Assessing current social vulnerability: a participatory" (<i>produit cobam 2.2.1</i>)			X	
Contribution à des ateliers dans la région	X	X	X	
Organisation d'un atelier d'échanges	X			
2.2.2. Des plans d'action locaux pour augmenter la capacité adaptative, incluant l'identification des besoins en interventions extérieures.				
Implémentation des (PIN) plans d'actions locaux en appliquant la méthodologie PAR	X	X		
Implémentation des activités du mentoring de projets pilotes, y compris l'élaboration des rapports de suivi et évaluation participative des projets pilotes (<i>voir ci-dessous, sous mentoring</i>)	X	X	X	
2.2.3. Des rapports périodiques sur le suivi et l'évaluation participatifs, incluant les indicateurs de vulnérabilité locale et leur performance dans le temps (en fonction des stratégies d'adaptation testées).				
Rapport de Suivi et évaluation participative (<i>produit cobam 2.2.3.</i>)	X	X	X	
3.1.2. Cartes participatives montrant les niveaux et les causes de dégradation forestière et déforestation dans les sites choisis				
Conception de la méthodologie de cartographie participative			X	
Elaboration des participatory maps depicting level and drivers of forest degradation and deforestation in selected field sites. (<i>produit cobam 3.1.2 ;voir aussi sous mentoring</i>)		X		
3.2.1. Documents sur les résultats dans les sites choisis : perceptions locales sur les potentialités et les pièges du REDD et les possibles projets REDD imaginés par les acteurs locaux, leurs impacts sur les modes de vie, les risques associés, les opportunités et les changements institutionnels nécessaires.				

perceptions locales sur les potentialités et les pièges du REDD+; leurs impacts sur les modes de vie, les opportunités et les changements institutionnels nécessaires. (<i>produit cobam 3.2.1.</i>)	X			
4.1.1. Article de synthèse sur les possibles synergies ou conflits entre l'adaptation et l'atténuation à l'échelle locale, avec une présentation de la réduction de la vulnérabilité ou l'apparition de nouvelles vulnérabilités suite aux actions d'atténuation ou d'adaptation.				
Analysis of possible synergies and conflicts between adaptation and mitigation (phase 3) (<i>produit cobam 4.1.1.</i>)	X			
4.2.2. Documentation des processus de développement et de mise en œuvre de projets				
Document de formation des gestionnaires et équipes des projets pilotes sur la PAR		X		
5.1.2. Manuel de conception de projet. Le manuel fournira des considérations clés sur les bonnes pratiques pour l'adaptation et le REDD				
Ecriture de la première ébauche du manuel de conception des projets pilotes, . (<i>cobam 5.1.2.</i>)		X		
Faire circuler la première ébauche du manuel de conception des projets pilotes	X			
5.2.1. Une synthèse des options politiques pour faciliter les synergies entre adaptation et atténuation, considérant les politiques actuelles et fournissant des recommandations pour faire évoluer ces politiques.				
Publication d'un document contenant la synthèse régionale sur les processus politiques de la REDD+ et de l'adaptation (<i>produit cobam 5.2.1.</i>)	X			
6.1.1. Un rapport sur les audiences à cibler en priorité, sur la meilleure façon de les atteindre, sur l'identification des partenaires de communication les plus efficaces à l'échelle régionale, nationale et locale, pour transmettre et partager les connaissances.				
Developper strategie de communication base sur les resultats du gaps analysis et elaboration d'un rapport (<i>produits cobam 6.1.1additonnal.</i>)	X			
Mise en œuvre de la stratégie de communication		X		
Co-organisation d'un événement régional	X			
Participation aux ateliers <i>hors de la region?</i>	X		X	
6.1.2. Un rapport sur les résultats de la recherche sur l'audience pour le processus de planification				
Rapport sur les résultats d'audience (site web, et radio) (<i>6.1.2.</i>)			X	
6.1.3. Un rapport sur les accords et les processus de partage de connaissances.				
Mentoring des journalistes, et elaboration d'un rapport sur le soutien des activités de sci-life et les resultats (<i>produit cobam 6.1.3.</i>)		X		
6.1.5. Des rapports périodiques sur les processus de partage de connaissances et leurs impacts, incluant une mise à jours de la cartographie des réseaux, montrant les changements dans la configuration des réseaux REDD et adaptation.				

Elaboration des rapports radio (<i>produit cobam 6.1.5.</i>) (including all MoU with local radios)		X		
Produit 6.2.1. Site web (créé et actualisé).				
Entretien et actualisation du site Web COBAM (<i>produit cobam 6.2.1.</i>)		X		
Produit 6.2.2. Liste de distribution.				
Liste de distribution à enrichir (<i>produit cobam 6.2.2.</i>)	X	X	X	
Promotion du projet COBAM à travers la liste de distribution	X	X	X	
Elaboration d'un rapport concernant la liste de distribution (<i>produit cobam 6.2.2.</i>)	X			
6.2.3. Dossiers pédagogiques et sessions de formation.				
Renforcement des capacités des populations et l'elaboration du training material pour les populations locales et les jeunes: role de l'arbre (<i>produit cobam 6.2.3.</i>)	X	X		
6.2.4. Produits de connaissances				
Produits de connaissance (articles, policy brief...)	X	X		X
Finalisation et publication des infobriefs sur les projets pilotes (<i>produit 6.2.4.</i>)				X
Kits pour la presse écrite, vidéo ou radio	X			X
Diffusion régionale du programme radio	X	X		X
Suivi des projets pilotes				
Définition du périmètre de projets		X		
Supervision des études pour établir l'état des lieux biophysique, socioéconomique, sociale		X		
Identification participative des activités et Planification participative			X	
Conception et mise en œuvre d'un plan de suivi-évaluation		X	X	
Suivi de mise en oeuvre des options d'adaptation et d'atténuation identifiées		X		
Etudes biophysiques dans les sites des projets pilotes	X	X		
Etudes sociales et socioéconomiques dans les sites de projets pilotes	X	X		
Appui aux étudiants accompagnant les projets-pilotes	X		X	
Total	27	29	15	5

Annexe 2. Plan de travail budget Annuel (PTBA) 2015

COMPOSANTE 2 : GESTION DURABLE DE LA BIODIVERSITE ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

VOLETS/ACTIVITES	ACTIONS A MENER	DATE DE DEMARRAGE	BUDGET	TAUX FAD	TAUX CEEAC	PART FAD	PART CEEAC
ACTIVITES DU CIFOR							
Volet 2: Adaptation aux changements climatiques							
2..1. Analyse des vulnérabilités locales au changement climatique et autres menaces et possibilités d'accroître la capacité adaptative locale (C2)							
	Publication d'un document de synthèse sur la vulnérabilité des groupes marginalisés (<i>produit cobam 2.1.3</i>)	03-janv	10 000	95%	5%	9 500	500
	Article de synthèse sur le rôle des forêts dans la réduction de la vulnérabilité des communautés locales (212)	03-janv	10 000	95%	5%	9 500	500
2.2. Définition, conception et mise en œuvre de stratégies locales d'adaptation par les communautés locales dans des sites choisis							
	Implémentation des (PIN) plans d'actions locaux en appliquant la méthodologie PAR	03-janv	-				
	Recherche action sur les projets pilotes		55 000	95%	5%	52 250	2 750
	Suivi évaluation des performances des projets		45 000	95%	5%	42 750	2 250
	Suivi des incidences et des impacts des projets	03-janv	35 000	95%	5%	33 250	1 750
2.2.1 Dialogue science politique							
	Contribution à des ateliers dans la région	03-janv	20 000	75%	25%	15 000	5 000
	Organisation d'un atelier de fin de projet	03-janv	75 000	75%	25%	56 250	18 750
	Voyage des participants	03-janv	80 000	75%	25%	60 000	20 000
	Elaboration et publications des policy briefs basés sur les résultats de l'étude sur les besoins de recherche et de renforcement des capacités (<i>produit cobam 1.1.1. et 6.2.4.</i>)		10 000	95%	5%	9 500	500
2.2.2 Analyse des politiques et réseaux au niveau régional et national							
	Publication d'un document contenant la synthèse régionale sur les processus politiques de la REDD+ et de l'adaptation	30-juin	15 000	95%	5%	14 250	750
	Finalisation et publication du rapport et documents pertinents (working paper) sur les Information and Knowledge of REDD+ and adaptation to climate change in the Congo Basin" (<i>produit cobam 1.1.1</i>)	30-juin	11 000	95%	5%	10 450	550
2.2.3 Analyse des perceptions de la vulnérabilité des communautés aux niveaux régional et national							
	Analyser les opportunités REDD à l'échelle régionale et nationale et publier le document intitulé "Tchatchou, Sufo, Chia, 2014. Opportunities and risks of REDD at the regional and national scales" (<i>cobam 1.4.3</i>)	30-juin	5 000	95%	5%	4 750	250

2.2.4 Elaboration du <u>manuel de conception des projets pilotes</u> d'adaption au changement climatique et REDD+							
	Manuel de conception des projets pilotes. (<i>cobam 4.2.2</i>)	01-avr	10 000	95%	5%	9 500	500
	Document de synthèse sur les leçons apprises dans les activités de terrain et le dialogue science-politique pour faciliter un processus itératif de partage des connaissances et de réflexion aux échelles nationales et régionale (5.1.1).	1er avril	2 000	95%	5%	1 900	100
2.2.8 Conception et développement du <u>site web</u> du projet COBAM							
	Entretien et actualisation du site Web COBAM (<i>produit cobam 6.2.1.</i>)	03-janv	10 000	95%	5%	9 500	500
3.1. <u>Analyse des modes de vie</u> , les institutions locales et les tendances de dégradation forestière et de déforestation dans des sites choisis							
	Article de synthèse sur les résultats des différents sites. Des critères seront utilisés pour comparer les différentes études locales. La synthèse des études de terrain offrira des possibilités de produire des résultats pertinents pour les décisions sur le REDD).	03-janv	15 000	95%	5%		
3.2. Analyse des impacts d'activités potentielles de REDD sur les modes de vie, ainsi que les risques, les opportunités et les changements institutionnels nécessaires							
	Analyse des possibles synergies ou conflits entre adaptation et atténuation (411)	03-janv	10 000	95%	5%	9 500	500
	Article sur les options pour réduire les conflits et favoriser synergies (421)	03-janv	10 000	95%	5%	9 500	500
6.1: Une stratégie itérative basée sur la recherche pour partager les connaissances est développée							
	Mise en œuvre de la stratégie de communication	03-janv				-	-
	Finalisation et publication des infobriefs sur les projets pilotes (<i>produits cobam 4.2.2. et 6.2.4.</i>)	30-juin	20 000	95%	5%	19 000	1 000
	Developper strategie de communication base sur les resultats du gaps analysis et elaboration d'un rapport (<i>produits cobam 6.1.1. et 6.1.2.</i>)	30-juin	25 000	95%	5%	23 750	1 250
6.2 Développement d'une communauté d'apprentissage sur le REDD et l'adaptation							
	Liste de distribution à enrichir (<i>produit cobam 6.2.2.</i>)	03-janv	2 000	95%	5%	1 900	100
	Promotion du projet COBAM à travers la liste de distribution	03-janv	-	95%	5%	-	-
	Elaboration d'un rapport concernant la liste de distribution (<i>produit cobam 6.2.2.</i>)	03-janv	2 000	75%	25%	1 500	500
6.3: Soutien au cycle d'élaboration des politiques par des relations avec les médias							
	Mentoring des journalistes, et elaboration d'un rapport sur le soutien des activites de sci-life et les resultats (<i>produit cobam 6.1.3.</i>)	03-janv	10 000	75%	25%	7 500	2 500
	Kits pour la presse écrite, vidéo ou r audio	03-janv	8 000	75%	25%	6 000	2 000
	Diffusion regional du programme radio	03-janv	5 000	75%	25%	3 750	1 250
	Relecture, traduction et impression des documents		60 000	95%	5%		

	Consultancies: besoins spécifiques, cartographie des incidences		35 000	95%	5%	33 250	1 750
	Elaboration des rapports radio (<i>produit cobam 6.1.5.</i>) (including all MoU with local radios) (<i>produit cobam 6.1.3.</i>)	03-janv	5 000	75%	25%	3 750	1 250
MENTORING DES PROJETS PILOTES							
Suivi de l'implémentation et suivi des projets pilotes	Redaction des PDD de trois projets	03-janv	-				
	Formation continue des gestionnaires et équipes des projets pilotes	03-janv	-				
Honoraires et déplacements du Mentor et des Consultants		01-janv	10 000	100%	0%	10 000	0
	Honoraires du mentor	01-janv	36 000	100%	25%	36 000	9 000
	Honoraires consultants	01-janv	80 000	100%	25%	80 000	20 000
	Déplacement mentor	01-janv	62 000	100%	25%	62 000	15 500
Services contractuels							
	Salaires du personnel CIFOR	01-janv	354 000	75%	25%	265 500	88 500
	Honoraires consultants	01-janv	100 000	75%	25%	75 000	25 000
	Deplacement monitoring projets pilotes	01-janv	75 000	75%	25%	56 250	18 750
	Honoraires des partenaires (IRD)	01-janv	11 627	75%	25%	8 720	2 907
	Honoraires points focaux des sites	01-janv	30 000	75%	25%	22 500	7 500
Acquisition des Equipements et matériels							
	Equipement	01-janv	6 000	100%		6 000	0
Coûts de fonctionnement (Coordination et Gestion)							
	Combustible	01-janv	6 437	95%	5%	6 115	322
	Location de voiture	01-janv	11 452	95%	5%	10 879	573
	Entretien et assurance véhicules	01-janv	5 000	95%	5%	4 750	250
	Fourniture de bureau	01-janv	10 584	95%	5%	10 055	529
	Télécommunications	01-janv	24 609	95%	5%	23 378	1 230
	Rapports d'avancement et de planification	03-janv	-				
	Reunions de coordination	03-janv	2 500	95%	5%	2 375	125
	Comité de suivi	02-mai	1 500	95%	5%	1 425	75
	Conférences, ateliers et réunions au Cameroun	03-janv	30 000	75%	25%	22 500	7 500
	Conférences, ateliers et réunions à l'extérieur	03-janv	59 779	75%	25%	44 835	14 945
	Charges de support à la recherche par le CIFOR	01-janv	40 000	75%	25%	30 000	10 000
Sous total			1 401 488			1 088 782	282 206
Coûts indirects pour le CIFOR (10% du Budget)			140 149			108 878	28 221
TOTAL			1 541 637			1 197 661	310 426

Premier semestre 770
818,4

598 830,3 155 213,08

